Összefoglaló

Ez a Stickman dojo projekt projektterve.

Verziók

Verzió	Szerző	Dátum	Státusz	Megjegyzés
0.1	Kishalmi Levente	2026-10-11	Előterjesztés	Legelső verzió

Státusz osztályozás:

Tervezet	Befejezetlen dokumentum
Előterjesztés	A projekt menedzser bírálatával
Elfogadott	A megrendelő által elfogadva

Tartalom

Projekt bemutatása 3

Szervezeti felépítés és felelősség megoszlás 4

A munka tartalma 5

Projekt költségvetés 6

Jelentések 6

Függelék 8

Projekt bemutatása

Ez a projektterv az első hivatalos dokumentum, mely leírja a csapat ötletét, lefekteti a legfontosabb technológiai és funkcionális alapokat, valamint bemutatja a tervezett fejlesztési folyamatot, mely során a Stickman Dojo projekt életre kel.

Háttér

A modern böngészős játékok piacán az utóbbi években egyre inkább eluralkodtak a túlbonyolított, nehézkesen betöltő, 3D-s webes alkalmazások. Ezzel párhuzamosan szinte teljesen háttérbe szorult a klasszikus flash-játékok korszakára jellemző közvetlen élmény: a könnyed, letisztult, azonnal játszható 2D-s verekedős játékok világa, ahol a játékosok egyetlen gépen, ugyanazon a billentyűzeten csaphattak össze egy szünetben vagy szabadidőben.

A mai felhozatalt tekintve a játékosoknak gyakran fiókregisztrációkat és bonyolult többjátékos szobákat kell kezelniük ahhoz, hogy egymás ellen játszhassanak egy gyors menetet. Bár az összetett esport-játékok betöltik a maguk szerepét, a böngészőből azonnal elérhető, egyszerű mechanikájú, lokális 1v1 verekedős élmény szinte teljesen eltűnt mára a webes szórakozásból. Ezt a hiányt szeretnénk kitölteni. Szocializáló hatásuk is van, hiszen az ilyen lokálisan játszható többszemélyes játékok összehozzák az embereket.

Célok

Főbb céljaink közé tartozik egy modern, moduláris, webes technológiákra épülő 2D-s verekedős platform játék lefejlesztése és folyamatos karbantartása, amely visszahozza a helyi többjátékos (couch multiplayer) élményt böngészős környezetbe.

Platformfüggetlen, azonnali játékélmény: Olyan webes klienst hozunk létre Canvas és Web Audio technológiára alapozva, amely külső függőségek vagy letöltések nélkül, azonnal futtatható bármely modern böngészőben.

Közös hardveren történő 1v1 harcrendszer: Egy billentyűzetre optimalizált irányítás megvalósítása két játékos számára, ahol a mozgás, a blokkolás, a közelharc (kardcsapás) és a távolsági támadás (lövedékek/energiagömbök) taktikai egyensúlyt alkotnak.

Átadandók

A projektcsapat a következő eredményeket fogja produkálni a projekt időtartama alatt:

- Projektterv.
- Osztály-, Use-case- és Szekvencia diagrammok
- Prototípus
- Design Pattern-t felvonultató tervek
- Implementáció

Költség- és erőforrás-szükségletek

Az erőforrásigényünk kb 3 személyhét.

A rendelkezésünkre álló pénzösszeg nem meghatározható, lévén a projekt saját kontóra készül, bár később adományozó rendszer bevezetése lehetséges.

Szervezeti felépítés és felelősség megoszlás

A projekt megrendelője a 2026-2027-es tanév első félévében, az SZTE PTI MSc szakán meghirdetett *Objektumvezérelt rendszerek tervezése* kurzus oktatói, Dr. Beszédes Árpád egyetemi docens és Antal Gábor gyakorlatvezető.

Projektcsapat

A projekt a következő emberekből áll:

	Név	**Email cím**
Megrendelő	Antal Gábor	antal@inf.u-szeged.hu
Projekt	Stickman dojo	
Projekt tag	Értekes Lóránt Attila	ertekes@inf.u-szeged.hu
	Kishalmi Levente	h366163@inf.u-szeged.hu
	Knyihár Roland János	h367297@inf.u-szeged.hu
	Nagy Kristóf Antal	kristof.nagy.03@gmail.com

Partnerek közötti felelősség-megoszlás

A csapat a feladatokat úgy osztotta fel hogy három front-end és egy back-end felelőst

jelölt ki. A három front-end fejlesztő feladatait a Modell-View-Controller modell mentén osztottuk szét. A back-end fejlesztésért felelős Nagy Kristóf, a front-end fejlesztésen belül a Model osztályokért felelős Értekes Lóránt, a View osztályokért felelős Kishalmi Levente, a Controller osztályokért pedig Knyihár Roland. Ezen felül bármelyik csapattag besegíthet a másik feladataiban amennyiben szükséges. Továbbá egy egységnek tekintendő feature implementálásához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek felelőse a feature megvalósítója.

A projekt menedzser felelőssége annyiban bővebb, mint a csapat többi tagja, hogy ő a felelős a határidők betartatásáért a csoporton belül, illetve felelős személyek keresése amennyiben a munka nem haladna tovább beavatkozás nélkül. Elősegíti továbbá az információk terjesztését.

Fontos, hogy nem egyértelmű tartalmazás áll fent a felelős és a végrehajtó szerepkörök között, értsd: a felelős pusztán azért felel, hogy a feladat el legyen végezve, a tényleges munkát azonban – közös megegyezés alapján – más is elvégezheti.

A munka tartalma

Átadandók és határidők

A főbb átadandók a projekt időtartama alatt a következők:

	Állomás	Leírás	Határidő
P1	*Projekt tervezet*	alapvető információk, management, ütemezési információk	2026-10-11 éjfél
P1	*Tervek*	UML diagramok a tervezett architektúráról	2026-10-11 éjfél
P1	*Prototípus*	75%-ban elkészült alkalmazás	2026-11-01 éjfél
P2	*Tervek*	UML diagramok, amennyiben változnak, bővülnek	2026-11-15 éjfél
P2	*Implementáció*	Végső projekt átadása	2026-12-06 éjfél

Feladatok definíciója és időbeosztása

A teljes feladatlista és időbeosztása az 1-es ill. 2-es függelékben található.

Munkakörnyezet

A projekt aktuális állapota alapvetően online verziókövető platformok szerverein lesz megtalálható, a fejlesztés szinkronizáció után minden csapattag saját gépén fog történni, melyek rendszerkörnyezetére nincs feltétel szabva. Az IDE-t illetően pusztán a projekt nyelve szab határt, mely a Python és TypeScript – így PyCharm, Visual Studio Code és WebStorm lesznek használva – amennyiben szükséges, egyetemi licencet igénybe véve – személyes preferenciától függően.

Rizikómenedzsment

Csapattag környezetének munkaképtelenné válása (hardverhiba, internet kimaradás)

- Prioritás: alacsony,
- Valószínűség: alacsony
- Mérséklési stratégia: Amennyiben megoldható a munka elvégzése egyetemi/munkahelyi környezetben

Csapattag személyének munkaképtelenné válása (sérülés, időhiány)

- Prioritás: közepes,
- Valószínűség: alacsony
- Mérséklési stratégia: Önszervező csapatként a kiesett munka eloszlik a többi csapattagon, tartós munkaképtelenség esetén specifikált funkcionalitások újratervezése

Projekt költségvetés

Kiadások és fedezet

(A valódi Kiadások és fedezet helyett lásd a 3. és 4. Függeléket)

Jelentések

Munka menedzsment

A munkát Kishalmi Levente menedzseli.

A választott csapatműködési elv mentén a projekt menedzser felelőssége annyiban bővebb csupán, mint a csapat többi tagja, hogy ő a felelős a határidők transzparensen tartásáért és azok betartatásáért a csoporton belül, illetve felelős személyek keresése is az ő felelősségköre amennyiben a munka nem haladna tovább beavatkozás nélkül.

Csoportgyűlések

A csapat minden héten szombaton online megbeszélést tart Discordon, ahol mód van az aktuális kihívások megvitatására, illetve a saját Discord szerverük chat-szobájában folyamatos kontaktra van lehetőség. Egy kérdés megvitatására bárki jelezheti az igényét, nem szükséges arról előbb a projekt menedzserrel tárgyalni.

Minőségbiztosítás

Unit teszteléssel, illetve az implementálandó funkcionalitásról Acceptance Criteria íródik. A fejlesztés során eszközölt változtatások code review után kerülnek végletesítésre.

Eredmények elfogadása

A projekt eredményeit a megrendelő fogja elfogadni. A projektterven változásokat csak a megrendelő engedélyével lehet tenni.

Az eredmények elfogadottnak tekintendőek, amennyiben időben lettek leszállítva illetve a projekt munka szinkronban van az adminisztratív jellegű dokumentációkkal.

Státuszjelentés

Minden leadásnál a projekt menedzser jelentést tesz a projekt haladásáról, és ha szükséges változásokat indítványoz a projektterven. Ezen kívül a megrendelő felszólítására a menedzser 3 munkanapon belül köteles leadni a jelentést.

A megrendelőnek lehetősége van minden héten személyesen is tárgyalni a projekt menedzserével, illetve a csapat többi tagjával, amennyiben úgy érzi további információt szeretne kérni, vagy változtatásokat eszközölne.

Átadás

A csapat GitHub Classroom elérhetősége*:* https://github.com/szte-ovrt-2026/projekt-maythebruteforcebewithyou

Itt megtalálható mind a projekt kódjának forrása (src mappa), mind pedig a dokumentációk (doc mappa).


Függelék

Függelék 1: Feladatlista

A Stickman dojo projekt 2026. szeptember 14-én indult. A következőkben a tervezett feladatok részletes összefoglalása található:

Feladat	**Felelős**
Projektterv	Közös
Acceptance Criteria írása	Közös
Code Review	Közös
Class Diagram	Értekes Lóránt
Képernyőtervek	Értekes Lóránt
Sequence diagram	Knyihár Roland
Use Case Diagram	Kishalmi Levente
Backend megvalósítása	Nagy Kristóf
Backend - Statisztika	Nagy Kristóf
Backend – Map-ek	Nagy Kristóf
View megvalósítása	Kishalmi Levente
View – karakter mapp lövedékek renderelése	Kishalmi Levente
View - HUD	Kishalmi Levente
View - Menu	Kishalmi Levente
Modell megvalósítása	Értekes Lóránt
Modell – fighter megvalósítása	Értekes Lóránt
Modell - projectile	Értekes Lóránt
Modell - platform	Értekes Lóránt
Controller megvalósítása	Knyihár Roland
Controller – Módosítható billentyűzet kiosztások	Knyihár Roland
Refactoring - tervezés és implementálás	Közös
Deployment (Docker)	Nagy Kristóf
Manuális tesztelés	Knyihár Roland
Projekt bemutatása	Közös

Függelék 2: Részletes időbeosztás

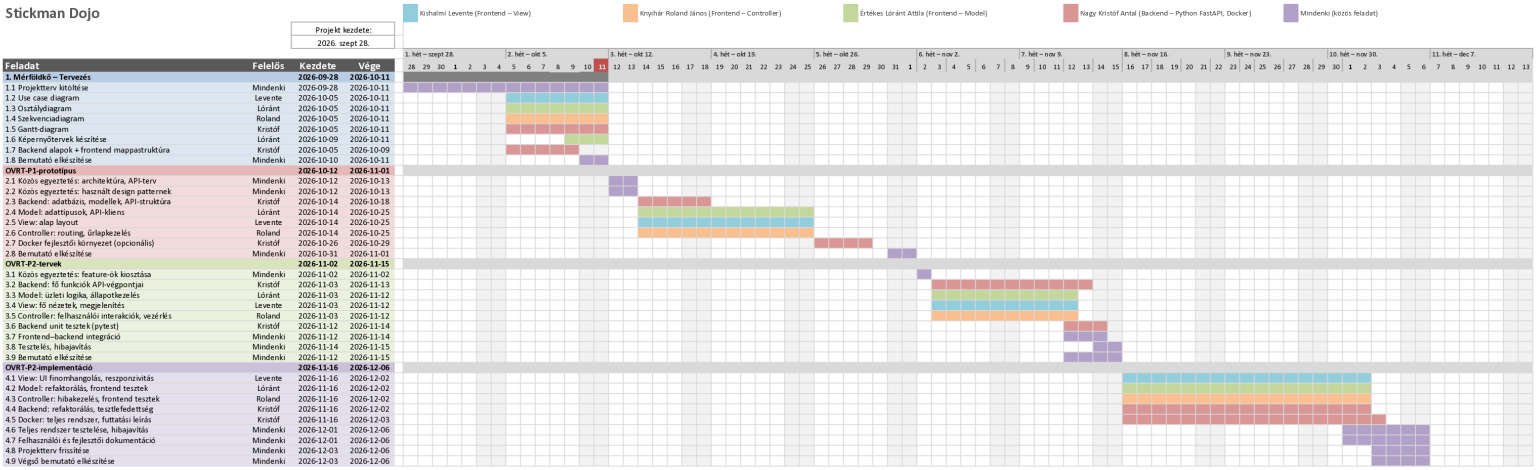

Függelék 3: Részletes költségvetés

Név	OVRT-P1/1	OVRT-P1/2	OVRT-P1/3	OVRT-P2/1	OVRT-P2/2
Értekes Lóránt	3	12	15	15	15
Knyihár Roland	3	12	15	15	15
Kishalmi Levente	3	12	15	15	15
Nagy Kristóf	3	12	15	15	15

Függelék 4: Átvétel

A projektet a megrendelő a következő eredménnyel vette át:

Név	OVRT-P1/1	OVRT-P1/2	OVRT-P1/3	OVRT-P2/1	OVRT-P2/2
Értekes Lóránt					
Knyihár Roland					
Kishalmi Levente					
Nagy Kristóf					

Szeged, 2026.10.11.

_____ _____

_____ _____
